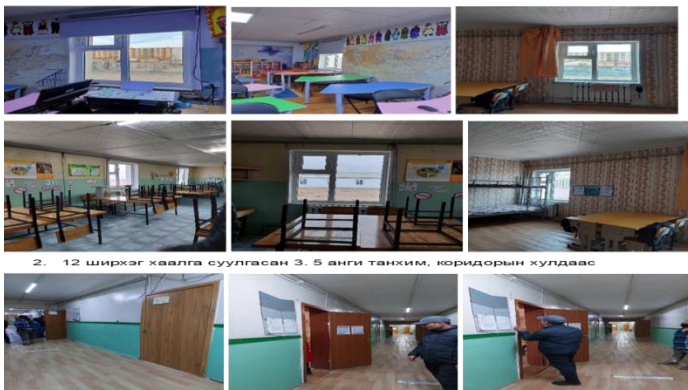


**ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН**

2022.11.22

Шивээговь сум

№	Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Эхлэх дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээлсэ н дүн	Хэрэгжилт	Хувь
1. Шилжих хөрөнгө оруулалт		1		22,602,378			
1.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өрөөний тохижилт	2	2022	1,500,000	1,500,000	Сумын 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өрөөний тохижилт”-ийн ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/83 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчээр “АМИН ЭНХ ЦЭНГЭЛ” ХХК -ийг сонгон шалгаруулан 5000000 төгрөгийн гэрээг 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр байгуулсан. 2022 оны 03 сарын 01-ний өдөр гэрээт ажлыг бүрэн засварлаж хүлээлгэн өгсөн. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОХИЖИЛТ ХҮЛЭЭН АВСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗУРАГ 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр 2022 оны 01-р сарын 14-ны өдрийн А/05 захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өрөө тохижуулах ажил №ГСАШГС-ШХА-10 дугаартай гэрээний дагуу Амин Энх Цэнгэл ХХК нь 2022 оны 03-р сарын 01-ний өдөр гэрээт ажлаа дуусгаж хүлээлгэн өгсөн. 	100
1.2	Усан хангамжийн системийг алсын горимд оруулах	3	2022	4,482,378	4,482,378	Шивээговь сумын Засаг даргын 2022 оны 01-р сарын 14-ны өдрийн А/05 дугаар захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил хүлээн авах комисс нь захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан “Усан хангамжийн системийг алсын горимд оруулах” ажлын №2021-ШХА-13 тоот гэрээний дагуу шинэчлэн, засварлах ажлыг гэрээний хавсралт, техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангасан байдал, ажлын чанар болон ажлын холбогдох баримтуудтай газар дээр нь танилцаж, шалгаж үзээд хүлээн авсан.	100

							
1.3	Сургуулийн дотуур байрны засвар	4	2022	5,070,000	5,070,000	Сумын 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 17 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Сургуулийн дотуур байрны засварын ажил”-ын ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/83 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчээр “ОЧИРТ ХӨРС” ХХК -ийг сонгон шалгаруулан 16.900.000 төгрөгийн гэрээг 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдөр байгуулсан. 2022 оны 03 сарын 14-ний өдөр ажлын тоо хэмжээний дагуу хийж гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн. СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗУРАГ 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр 2021 оны 08-р сарын 02-ны өдрийн А/125 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг ОЧИРТ хөрс ХХК-ий гүйцэтгэсэн сургуулийн дотуур байрны засварын ажлын гүйцэтгэлийг акт үйлдэн хүлээж авсан. 1. 16 ширхэг вакум цонх хийгдсэн.  2. 12 ширхэг хаалга суулгасан 3. 5 анги танхим, коридорын хульдаас	100
1.4	Алсын 1,2-р худгийг шинэчлэх, засварлах	5	2022	1,970,000	1,970,000	Сумын 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Алсын 1,2-р худгийг шинэчлэх, засварлах”-ын ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/83 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж,	70

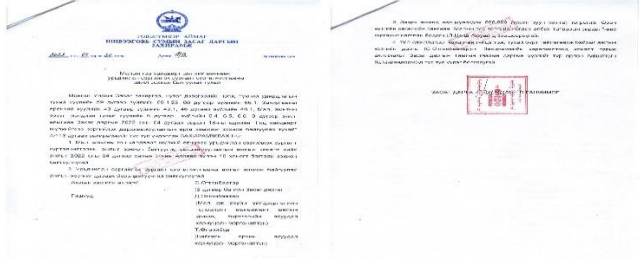
						гүйцэтгэгчээр “ТЕЧ СМАРТ СОЛЮШН” ХХК -ийг сонгон шалгаруулан 19.700.000 төгрөгийн гэрээг 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ний өдөр байгуулсан. 2022 оны 01-р сарын 14-ний өдрийн А/03 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн гишүүд Алсын 1,2-р худгийг шинэчлэх, засварлах ажил хүлээн авахаар комисс ажилласан боловч “Теч смарт Сольюн” ХХК-н гүйцэтгэсэн ажил засаж сайжруулах шаардлагатай байсан тул үүрэг даалгаврын биелэлт өгсөн.	
1.5	3-р цэцэрлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	6	2022	6,880,000	6,880,000	Сумын 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “3-р цэцэрлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдаж авах” ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/34 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчээр “Маммот линк” ХХК -ийг сонгон шалгаруулан 17.200.000 төгрөгийн гэрээг 2021 оны 09 дугаар сарын 07-ний өдөр байгуулсан. Засаг даргын А/155 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 2022 оны 11 сарын 15-ны өдөр ажлын тоо хэмжээний дагуу гүйцэтгэлийг хүлээн авсан	100
1.6	Боржигон өв соёлын танхимтай болох /үзмэрийг баяжуулах/	7	2022	1,500,000	1,500,000	Сумын 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Боржигон өв соёлын танхимтай болох /үзмэрийг баяжуулах/”-ийн ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/83 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчээр “ЧОЙР УРЛАН” ХХК -ийг сонгон шалгаруулан 5000000 төгрөгийн гэрээг 2021 оны 09-р сарын 16-ний өдөр байгуулсан. 2021 оны 12-р сард гүйцэтгэлийг 100% хүлээн авсан боловч гэрээний үлдэгдэл санхүүжилт болох 1,5 сая төгрөгийг шилжүүлэг хийгдээгүй 2022 оны 04-р сарын	100

						22-ны өдрийн ИТХ-ын 11-р хуралдааны 8-р тогтоолоор батлагдаж санхүүжилт бүрэн хийгдэж дууссан. 	
1.7	Мэргэшсэн төсөвчний зардал	8	2022	1,200,000	1,200,000	2021 оны 07-р сарын 01-ны өдөр мэргэшсэн төсөвчин Ц.Адъяатай 2021, 2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөвт ажлуудад төсөв хийлгэхээр 2200000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 2021 онд 5 ажил дээр төсөв хийлгэсэн бөгөөд гэрээний дүн болон 1000000 төгрөг, 2022 оны гэрээний дүн 1200000 төгрөгийг үйлдэгдлийг 2022 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн ИТХ-ын 11-р хуралдааны 8-р тогтоолоор батлагдаж санхүүжилт бүрэн хийгдэж дууссан.	100
2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт		9					
	2.1 Ажил /их засвар/	10		512,091,2			
2.1.1	Сумын төв болон гудамж талбайн гэрэлтүүлэг нэмэх, гэрлэн чимэглэл хийх ажил	11	2022	81,400,000	79.880.83³ Хэмнэлт 1,519,167	Сумын төв болон гудамж талбайн гэрэлтүүлэг нэмэх ажлын даалгаварт орон сууцны байрнуудын хооронд 22 ширхэг гэрэлтүүлэг, төв гудамжны 12 ширхэг гэрэлтүүлэг, байрнуудын дээд ирмэгээр 2200м туузан гэрэлтүүлэг тус тус хийгдсэн. Сумын Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/102 “Сумын төв болон гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл хийх ажил”-ын гүйцэтгэлийг хүлээж авах комисс томилох тухай захирамжийг танилцуулж гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн гүйцэтгэл, угсралтыг гүйцэтгэлийг хийсэн “ОДЖИ ОД” ХХК-ийн ажлыг хүлээн авсан.	100

							
2.1.2	Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах ажил /сэвхүүл, хороолол, урсах хороолол, 3-р цэцэрлэгийн дотор гадна цахилгааны монтаж/	12	2022	153,000,000	151.740.1 31 Хэмнэлт 1,259,869	Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах ажил /Сэвхүүл хороолол, Урсах хороолол, 3-р цэцэрлэгийн дотор гадна цахилгаан монтаж/ -ыг гүйцэтгэх ажил ГСАШГСЗДТГ/202212002 дугаар ажлыг Пи Эс Пи ХХК-тай 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр 2022-НТШ-02 тоот гэрээг 151,740,131 төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан. Аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн Б.Дэлгэрдалай шугамын ажил эхлүүлэхэд бараа материал болон ажлын явцад хяналт тавьсан. Урсах, сэвхүүл хороололын цахилгаан шугам бүрэн татагдаж дуусан. Тус ажлыг ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авсан. Үлдэгдэл 30 хувь үүрэг даалгаварын биелэлт ирүүлсэний дараа шилжүүлнэ. 	70
2.1.3	Иргэний танхимын засвар	13	2022	25,482,900	24.866.21 2 Хэмнэлт 616,688	Иргэний танхимын засварын ажил Ган жигүүр констракшн ХХК-тай 2022 оны 04-р сарын 26-нд 2022-ХА-03 тоот 24,866,212 төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан. 2022 оны 05 дугаар сарын 02-нд засварын ажлаа эхлүүлсэн. Засварын ажил өрөө хоорондын хана нураах, хуучин модон цонх буулгах, модон шал хуулж засвар тохижилтыг хийх ажил бүрэн хийгдсэн. Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 31-	100

						ний өдрийн А/66 захирамж “Иргэний танхимын засвар” ажлыг хүлээж авах комисс томилсоны дагуу ажлын гүйцэтгэлийг тоо хэмжээний дагуу хүлээн авсан. 	
2.1.4	Сумын нийтийн эзэмшлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний цэвэр усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	14	2022	193,553,700	185.549.300 Хэмнэлт 8,004,400	Сумын нийтийн эзэмшлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний цэвэр усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил Стронг найс констракшн ХХК компанитай 2022 оны 04-р сарын 18-нд 2022-НТШ-01 тоот 185,549,300 төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан. 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-нд ажлаа эхлүүлсэн. Аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн Б.Дэлгэрдалай шугамын ажил эхлүүлэхэд бараа материал болон ажлын явцад хяналт тавьсан. Засаг даргын 2022 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн А/57 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 2022 оны 05-р сарын 24-ны өдөр “Сумын нийтийн эзэмшлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний цэвэр усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил”-ын гүйцэтгэлийг хүлээн авахаар хуралдаж гишүүдийн саналыг үндэслээд хүлээн авах комиссын шийдвэрээр ажлыг комисс хүлээн авлаа. Тухайн ажилд аймгийн Онцгой комиссын чиг үүргийн дагуу шинээр сольсон шугамд галын гидрант хийж гүйцэтгэсэн, мөн гулсах, үл хөдлөх тулгуур, зарим холбох хэрэгсэл тоо хэмжээнд орхигдуулсаныг хийсэн ажлын даалгаврын дагуу ф150-250мм -ийн ган цайрдсан хоолойг 0,4км зайд шинэчлэн сольж гүйцэтгэлээ.	100

							
	Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, засварлах			38,654,600		Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, засварлах ажлыг 2 удаа зарласан боловч оролцогч компани орж ирээгүй.	-
2.1.5	Бохирын шугамын бөглөө гаргах, засварлах	16	2022	20,000,000	19,900.000 Хэмнэлт 1,000,000	2022 оны 05-р сарын 18-нд Барсүүлт ХХК-тай гэрээ байгуулсан бөгөөд 2022 оны 05-р сарын 25-нд ажлын гүйцэтгэл эхэлсэн. Ажлын даалгаварт 800 метр газарт 15 худгийн бөглөө гаргаж, цэвэрлэх, худгийн таг шинэчлэн солих засварлах ажил байсан. гүйцэтгэлийн явцад шороонд дарагдсан мэдэгдээгүй худгуудыг илрүүлэн гаргаж, цэвэрлээд засварласан. Нийт 32 худгийн бөглөө гаргаж, цэвэрлэж, лаг хог хаягдлыг хогийн цэгрүү ачиж зөөвөрлөсөн. Нийт 1,2км газарт 32 худгийг засварлаж 2022 оны 06-р сарын 09-нд хүлээлгэн өгсөн. 	100
	2.2 Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ	17		84,131,500			
2.2.1	Мал, аж ахуйн арга хэмжээний зардал	18	2022	43,131,500	43,131,500	Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/52 тоот захирамжийн дагуу Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сургалчилгааны ажил зохион байгуулж, вакцинжуулалтын ажлын хяналт хийх ажлыг 2022 оны 04-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 10 хоногт	70

						багтаан зохион байгуулан 500,000 төгрөг сургалтад зарцуулагдсан байна.  Сумын Засаг даргын 2022 оны 06 сарын 20-ны өдрийн А/71 дүгээр захирамжаар суманд малын тэжээлийн ургамал тариалах ажлыг 07 сарын 21-нээс 08 сарын 10-ны өдөр хүртэл зохион байгуулсан. Үүнд: “Говь мах импекс” ХХК-аас 200кг тэжээлийн ургамалыг 400,000 төгрөгөөр авч малчин, мал бүхий иргэдэд олгосон. Нийт зарцуулсан өртөг: 900,000 төгрөг	
2.2.2	Байгаль хамгаалах, орчны бохирдлыг бууруулах-хоггүй арга хэмжээний зардал	19	2022	30,000,000	30,000,000	Засаг даргын 2022 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/50 дугаар захирамжийн дагуу сэг зэм устгалын ажлыг шивээговь сумаас хаялга нуур, хаялга нуураас 21-р зөрлөг, 21-р зөрлөгөөс 22-р зөрлөг, 22-р зөрлөгөөс Шивээговь сум, Шивээговь сумаас засмал зам өөхий, өөхий-хусмал зам- 22р зөрлөг, 22-р зөрлөгөөс Шивээговь сум, шивээговь сумаас 4 нүхэн гүүр-төмөр зам, төмөр замаас хогийн цэг хүртэл маршрутаар зохион байгуулсан. 7 албан хаагч 2 техник хэрэгсэлтэйгээр 374 километр явж, хонь 13, үхэр 8, адуу 5, ямаа 15, зээр 15, нийт 56 малын сэг зэмийг 1 цэгт, 40 кг ариутгалын бодис хэрэглэн, халдваргүйжүүлэлт хийн булж устган ажилласан. 522,782 төгрөгийг шатахууны зардалд, 403,000 төгрөгийг шаардлагатай бараа материалын зардал зарцуулсан.	70

					Сэг зэм устгаж байгаа байдал  Золбин нохой, муур устгалын ажил Засаг даргын 2022 оны 04 сарын 15-ны өдрийн А/45 тоо захирамжын дагуу сумын хэмжээнд золбин нохой муур устгалын ажлыг 2022 оны 04 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласан. Зар мэдээллийг иргэдэд цахимаар 3 удаа байршуулсан. Устгалаар 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15-р байр, зүүн гэр байр, урд гэр байр, 21-р зөрлөг, Страто ХХК, 22-р зөрлөг, Шивээ-Овоо ХК, маршрутаар нохой муур устгалыг хийж 64 нохой, 1 муурыг устгаж нийт 1,300,000 төгрөгийг зарцуулсан. Засаг даргын 2022 оны 07 сарын 27-ны өдрийн А/77 тоо захирамжын дагуу сумын хэмжээнд золбин нохой муур устгалын ажлыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-13-ны өдрүүдэд 34 нохой, 3 муур устгаж 740,000 төгрөг зарцуулсан.  Шивээговь Сум ЗДТГ Дөрөвдүгээр сарын 15-нд 21:55 цагт · 🌐 Иргэдийн анхааралд: Суманд золбин нохой, муур ихсэж байгаатай холбогдуулан золбин нохой муур устгалын ажлыг 2022 оны 04 сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж тул өөрсдийн тэжээвэр нохойгоо уяж, бага насны хүүхэд багачуудыг хараа хяналттай байлгаж хамтран ажиллана уу. 👍 12 1 сэтгэгдэл 3 удаа хуваалцсан 👍 Таалагдлаа 💬 Сэтгэгдэл ➦ Хуваалцах  Dorjsuren Oyunchimeg Ashgvi de ix bayrlaj bna Таалагдлаа Хариулах 3x Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зам дагуух ногоон байгууламжийн мод усалгааны системийн ажлыг 20,000,000 сая төгрөгөөр “Жавхлант-АРИВЖИХ” ХХК-н хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 1. Мод усалгааны, ус нөөцлөх сав 2ш, 4,5 тонн 2. Мод усалгааны системийг бүрэн холбох 2ш тоолуур, 20,30 шилжүүлэгч-6, 20,30 хаалт-4ш
--	--	--	--	--	--


						Ажлын тоо хэмжээний дагуу бүрэн гүйцэтгэж 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн. Нийт зарцуулсан өртөг: 17,965,782 төгрөг	
2.2.3	Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний зардал	20	2022	6,000,000	6,000,000	Команд штабын бэлтгэл сургуулалтад зарцуулагдсан төсөв 1,000,000 /нэг сая/ төгрөг. Засаг даргын 2022 оны 03-р сарын 23-ны өдрийн А/32 тоот “Команд штабын сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай” захирамжийн дагуу бэлтгэл ажлыг хангах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан тухайн төлөвлөгөөнд батлагдсан 1 сая төгрөгийг ОНХС-ийн Гамшгаас хамгаалах зардлаас зарцуулсан.  2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/91 дугаартай захирамжийн дагуу “Гамшигаас хамгаалах зардал”-аас 6,5кВаттын хүчин чадалтай цахилгаан мотор 2,765,000 төгрөгөөр худалдаж авсан. Мөн 10м уртасгагч нэг ширхэг худалдаж авсан.  Нийт зарцуулсан өртөг: 3,875,000 төгрөг	70
2.2.4	Баяр наадмын зардал	21	2022	5000000	5,000,000	2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн Засаг даргын А/73 дугаар захирамжаар сумын баяр наадмыг 07 дугаар сарын 03-04 зохион байгуулсан. Баяр наадмаар 32 бөх, сур харваа, шагайн харваа, 6.	100

						насны хурдан морьдын уралдаан зохион байгуулсан.	
	2.3 Зөвлөх үйлчилгээ	22		20000000			
2.3.1	2023 онд хийгдэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах	23	2022	20,000,00 0	20,000,00 0	2022 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/113 дугаар захирамжийн дагуу "2023 онд хийгдэх ажлын зураг төсөв боловсруулах" ажлын саналыг "КЛАССИК ХАУС ХХК", "ЭЙ АР СИ ЭЙЧ ХХК", КИНГСКИЙ ИНЖЕНЕР ЭНД КОНСТРАКШН ХХК-аг хамтаар нь үйлдвэрлэж байгаа. шууд гүйцэтгэлийн ажлыг 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр сонгон шалгаруулж "ЭЙ АР СИ ЭЙЧ ХХК"-тай гэрээ байгуулсан.	30
	НИЙТ ДҮН	24		638,825,0 78			

Тайлан боловсруулсан:

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн  Б.Алтансүх

Хянасан:

Засаг дарга  П.Ганчимэг
